
AIMOC WIM

02 - Statis modular + WIM berdampingan

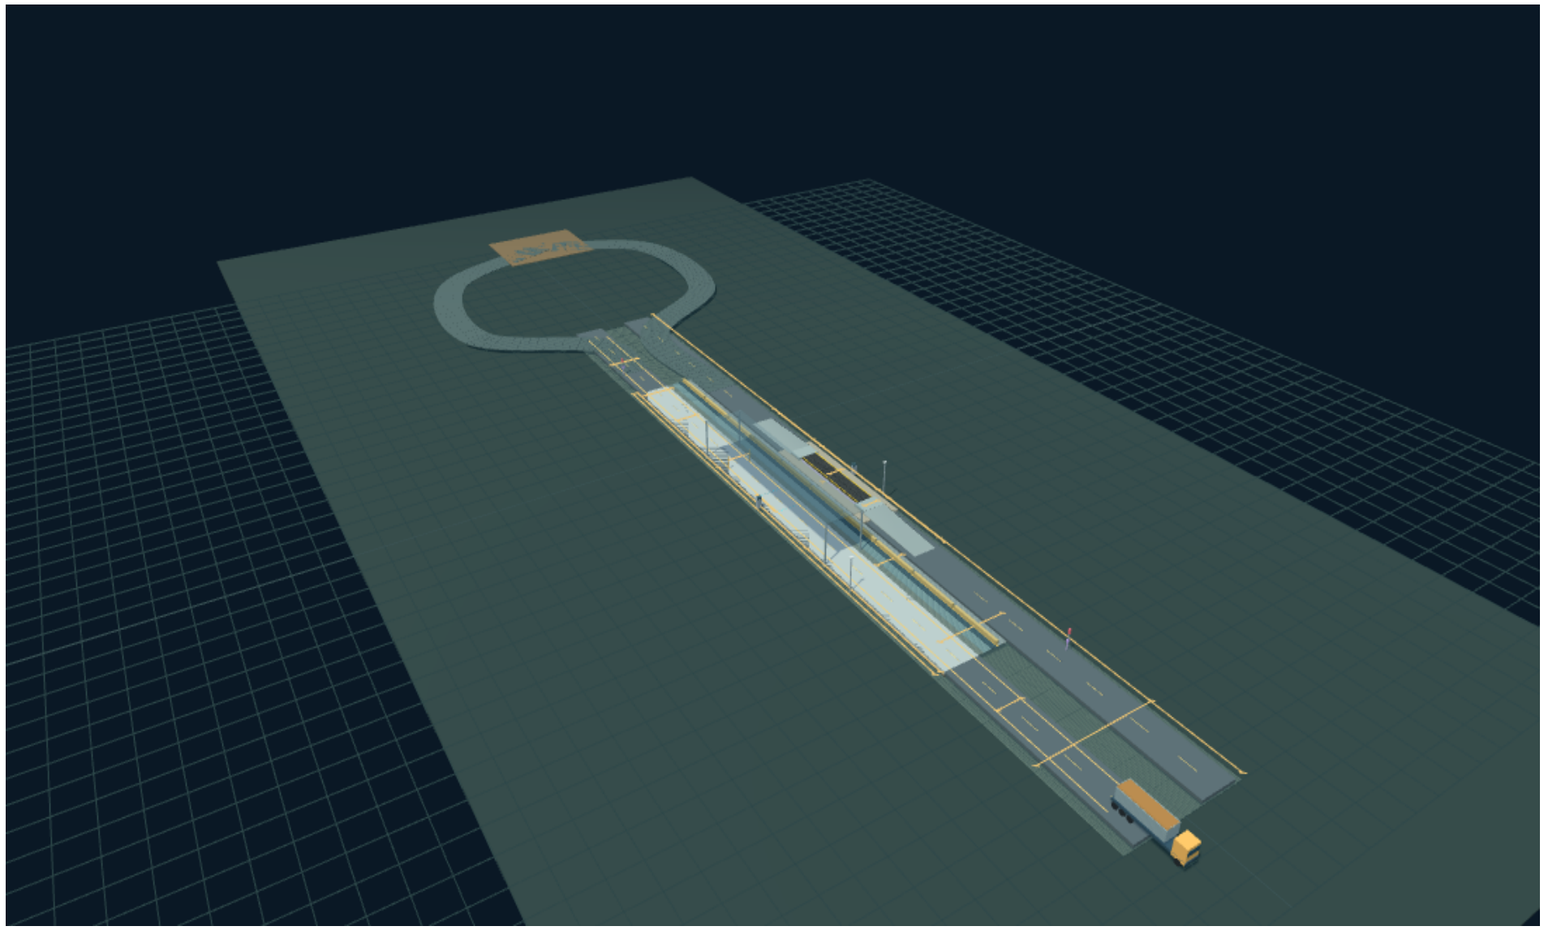

Modular static: 80 t x 20 kg; pitless modular

Platform 18 x 3 m; drawing overall width 3.20 m

6 modules: 1.50 x 6.00 x 0.308 m each

8 x Balanza LX8 30 t; Fine FS-8000

Static deck +1.608 m; rise 0.708 m*

Ramps 2 x 14.16 m @ 5%; footprint 52.32 m*

WIM 100 x 6.5 m; live lane 4.5 m

Working corridor 22 x 170 m; centres 12.5 m

*Elevasi, ramp, landing dan raft adalah asumsi koordinasi; PDF tidak memberi gambar fondasi. Lebar 3,2 m adalah dimensi luar, bukan lebar bersih.


Truk 3,2 m memerlukan kajian posisi ban/guard rail; simulasi menahan transaksi pada profil tersebut. QR tidak menggantikan IR.

Sumber: PDF teknis yang diberikan pelanggan, halaman 3-9. Harga dan kontak pribadi tidak diterbitkan.

Komponen	Spesifikasi	Catatan sumber
Jenis / kapasitas	Pitless modular movable · 80 t × 20 kg	PDF p. 8
Platform nominal / lebar luar gambar	18 × 3 m / 3.20 m	PDF p. 4, 8 · bukan lebar bersih / not clear width
Modul / susunan	6 × (1.50 × 6.00 × 0.308 m) · 2 across × 3 longitudinal	PDF p. 4, 8
Struktur / permukaan	L-Series steel · chequered steel deck	PDF p. 5 · 308 mm = module depth, not plate gauge
Pagar / dimensi per unit	12 × (75 × 2900 × 180 mm)	PDF p. 4, 8
Finishing	Sandblasting + 2-tone heavy-duty powder coating 300 um; black platform / yellow rails	PDF p. 3, 8
Load cell / mounting	8 × Balanza LX8 30 t analog + 8 mounts	PDF p. 7-8 · scale stays 80 t, not 240 t
Indikator	Fine FS-8000 · Korean · table/panel · 7-digit blue display · aluminium housing	PDF p. 7-8
Fungsi indikator	Auto span calibration; push-button/auto tare; peak/sample hold; M+/M-; claimed 10-year data backup	PDF p. 7 · modes/retention to verify


Komponen	Spesifikasi	Catatan sumber
Junction / kabel / surge	1 × 8-channel stainless junction box; 8 cable thyristor items; 25 m load-cell cable; 1 surge protection	PDF p. 7-8 · cable thyristor term requires clarification
Spesifikasi sel	Combined error ±0.03% F.S.; zero balance ±1% F.S.; insulation 5000 Mohm; operating -20...+70°C	PDF p. 7 · cell specs, not whole-scale accuracy
Sensitivitas / overload sel	PDF: 2.0 ±0.002%mV/V; safe load 150% F.S.; ultimate 200% F.S.	PDF p. 7 · sensitivity notation requires clarification; not operating permission
Proteksi sel	PDF lists IP67 (5 t), IP68 (10-15 t); 30 t rating NOT specified	PDF p. 7 · no IP68 claim for quoted 30 t cells
Material sel	Alloy steel / stainless steel listed; selected variant unconfirmed	PDF p. 7 · confirm coastal corrosion grade
Software lokal	CALISTA / Callista standard: single/double weighing, multilevel access, ticket customisation, Excel export, reports	PDF p. 7-8 · spelling differs; not a confirmed API
Perlengkapan kalibrasi	5 × 20 kg test weights listed; not sufficient by themselves for full 80 t verification	PDF p. 8 · authority/OEM test-load plan needed
Fabrikasi / instalasi	30 days after PO if unavailable; on-site installation 4 working days	PDF p. 9 · not total civil / commissioning duration
Garansi / metrologi	Electronics 1 year; structure 3 years, conditional; type approval claimed, certificate not supplied	PDF p. 6, 9 · verify exact approval and site tera

DENAH · Static 18 × 3 m + WIM

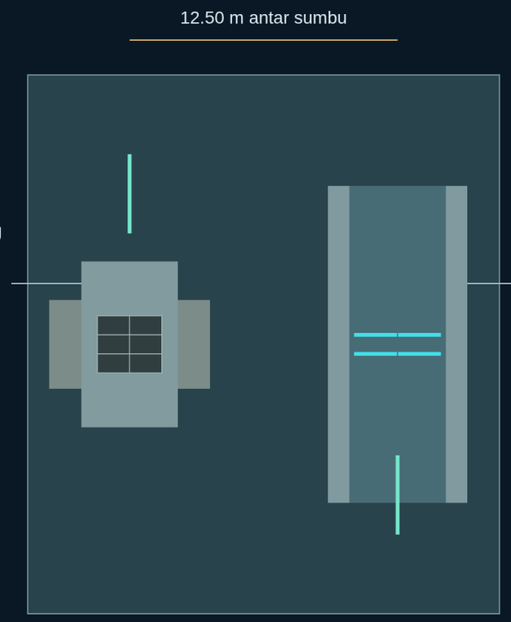

*Ramp, landing, raft dan elevasi: asumsi koordinasi; fondasi OEM belum tersedia.

POTONGAN · MODUL BAJA DAN TUMPUAN

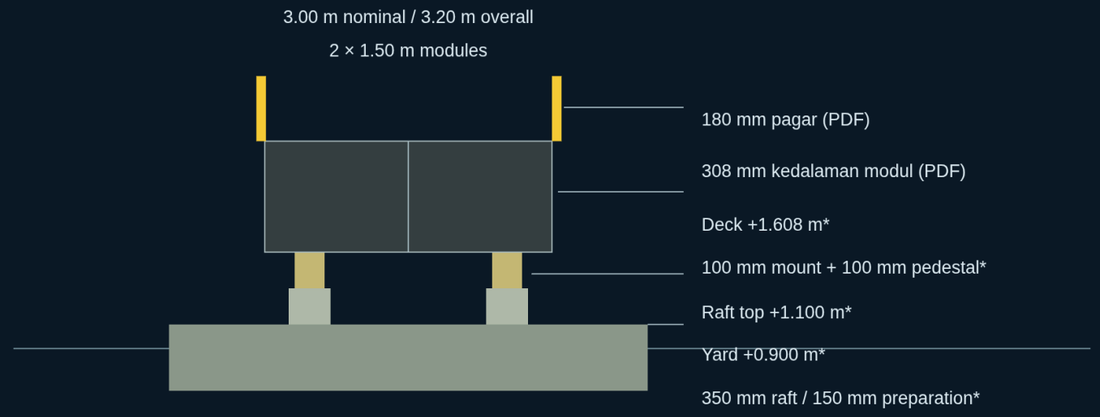

*Asumsi sipil untuk tanah reklamasi, bukan detail fondasi Static. Skala vertikal diperbesar.

308 mm adalah tinggi total modul, bukan ketebalan plat baja. Posisi/ukuran mounting 3D bersifat ilustrasi.

Asumsi sipil: raft 28 x 7,5 x 0,35 m; pedestal 100 mm; mount 100 mm; deck modul 308 mm. Tidak ada desain tulangan, mutu beton, angkur atau bearing dari OEM. Verifikasi settlement, rob, drainase, korosi dan interaksi ke WIM sebelum konstruksi.

Bagian	Dimensi / posisi	Status
Timbangan statis	Modular static · 80 t × 20 kg · pitless modular	Data PDF; resolusi bukan akurasi
Platform / lebar luar	18 × 3 m / 3.20 m	Nominal berbeda dari lebar luar gambar; bukan clear width
Modul	6 × 1.50 × 6.00 × 0.308 m	2 melintang × 3 memanjang; kedalaman modul bukan tebal plat
Koridor / sumbu	22 × 170 m / 12.50 m	Koordinasi; tidak termasuk loop/holding/setback
Raft statis / pemisahan	28 × 7.50 × 0.35 m / 5.50 m	ASUMSI, bukan gambar OEM; interaksi tanah belum diverifikasi
Elevasi konsep	Yard +0.900; raft +1.100; pedestal 0.100; mount 0.100; deck +1.608 m	Selain modul 308 mm, elevasi/tumpuan adalah asumsi koordinasi
Ramp / landing konsep	2 × 14.16 m @ 5%; 2 × 3 m; footprint 52.32 m	Naik 0.708 m; ramp pendekat lebar 4.5 m menuju deck 3 m; taper perlu desain OEM
Pagar / sel	12 × 75 × 2900 × 180 mm; 8 × 30 t	80 t kapasitas sistem; 8 × 30 t bukan kapasitas 240 t
WIM / lapisan	100 × 6.50 m; 4.50 m lane; 1 m shoulders; 450/300/150 mm	Konsep beton/base/subbase; tetap perlu desain struktur
Quartz / posisi	4 × 2 m; 50 mm gap; 6 m row spacing; lane edge 225 mm	2 row; resin epoxy pada slot sesuai OEM
Kanopi WIM	40 × 8 m; 7 m clear; gantry 6.5 m	Tumpuan terpisah dari struktur timbang
QR / detektor	Entry Z=-56; exit Z=+60; IR Z=+14	1 IR set keluar; 2 CCTV dan 2 QR

OEM / sipil

PDF tidak memberi gambar fondasi, ukuran ramp, tulangan, mutu beton, bearing atau detail angkur. Gambar fondasi tersedia setelah PO.

Tanah reklamasi / rob

Raft 28 × 7,5 × 0,35 m, elevasi dan ramp di simulasi adalah asumsi koordinasi. Periksa CPT/SPT, settlement, interaksi ke WIM, drainase/rob dan batas galian.

Truk / ruang bebas

Platform nominal 3 m berbeda dari lebar luar 3,2 m. Truk 3,2 m masuk status engineering hold sampai posisi ban, guard rail dan swept envelope disetujui.

Antarmuka / AIMOC

Port/protokol FS-8000, unit, gross/tare/net, stable flag, checksum dan lisensi software belum diberikan. Gateway IoT adalah scope integrasi tambahan; Excel export bukan API real-time.

Metrologi / FAT-SAT

Verifikasi persetujuan tipe untuk varian yang dipasang, tera lokasi, uji eksentrisitas/stabilitas/repeatability dan beban uji. Resolusi 20 kg bukan jaminan error ±20 kg.

Lingkungan / lingkup

Konfirmasi IP dan material sel 30 t, proteksi garam/banjir serta touch-up coating. PDF mengecualikan fondasi, tanjakan, rumah timbang; listrik, kabel dan alat angkat dari pelanggan. Cakupan komputer/tera perlu klarifikasi karena daftar dan syarat berbeda.

Jadwal PDF: fabrikasi 30 hari bila tidak tersedia + instalasi alat 4 hari kerja; tidak termasuk sipil/curing/integrasi/tera. Validasi tanggal/revisi PDF, IP sel 30 t, sensitivitas, scope komputer/tera dan sertifikat persetujuan tipe.
